

تقرير الربع الثالث 2026 م

يوليو - أغسطس - سبتمبر

يغطي هذا التقرير أداء الحملات التسويقية في محطات درب خلال الربع الثالث من عام 2026 م، ويعرض لكل حملة قسماً مستقلاً يوضح أداؤها ومستهدفاتها وما تحقق منها وما لم يتحقق مع بيان المبررات، إضافة إلى مستهدفات فريق العمل الدورية، والتحديات التي واجهت التنفيذ والفرص الممكنة الاستفادة منها في الربع القادم.

فترة التقرير	المحطات المشمولة	عدد الحملات	تاريخ الإصدار	الجهة المعدة
1 يوليو - 30 سبتمبر 2026 م	4 + 9 محطات	5 حملات	28 سبتمبر 2026 م	إدارة التسويق

5	64,949	37,805	4,356,512
حملات منقّدة	إجمالي الإنفاق (ر.س)	إجمالي التفاعلات	إجمالي الوصول
يوليو 1 - أغسطس 3 - سبتمبر 1	منها 36,142 رس على الحملات ذات الميزانية المعتمدة	مقابل مستهدف 16,000 — 236%	مقابل مستهدف 400,000 — 1,089%

المستهدفات · ما تحقق منها وما لم يتحقق

تُقدت خلال الربع الثالث خمس حملات: أربع حملات «البنزين المجاني للسيارات الأولى» المرتبطة بافتتاح المحطات في يوليو وأغسطس، وفعالية اليوم الوطني في تسع محطات خلال سبتمبر. تجاوز الأداء الإعلامي للحملات الأربع مستهدفاته بفارق كبير — الوصول بلغ عشرة أضعاف المستهدف — وظل إنفاقها ضمن المخصص بفارق 0.4%. في المقابل تُقدت فعالية اليوم الوطني بتكلفة 28,807 ر.س دون مستهدف معتمد ودون قياس وصول أو تفاعل، ولم يُقس أي أثر تجاري لأي من الحملات الخمس.

المؤشر	المستهدف	المتحقق	نسبة الإنجاز	الحالة	ملاحظة
الوصول / المشاهدات	400,000	4,356,512	1,089%	✓ تحقق	لأربع حملات من خمس — فعالية اليوم الوطني غير مقيسة
التفاعلات	16,000	37,805	236%	✓ تحقق	لثلاث حملات رُصد لها مستهدف تفاعل من أصل خمس
الالتزام بالميزانية المخصصة	36,000 ر.س	36,142 ر.س	100.4%	⦿ تحقق جزئياً	للحملات الأربع ذات الميزانية المعتمدة فقط
إجمالي الإنفاق على حملات الربع	لم يُعتمد مستهدف شامل	64,949 ر.س	—	غير مُقارن	منها 28,807 ر.س لفعالية اليوم الوطني دون ميزانية معتمدة
تغطية أشهر الربع بالحملات	3 أشهر	3 أشهر	100%	✓ تحقق	يوليو 1 · أغسطس 3 · سبتمبر 1
مهام الفريق الدورية	9 مهام	1 مكتملة	44%	⦿ تحقق جزئياً	متوسط الإنجاز · التفصيل في القسم 05
الفرص التجارية	لم يُحدّد	0	—	غير مُقاس	لم يُفعّل القياس في أي حملة
العملاء المحوّلون	لم يُحدّد	0	—	غير مُقاس	لم يُفعّل القياس في أي حملة
عائد الإنفاق (ROAS)	لم يُحدّد	0x	—	غير مُقاس	يتعدّر احتسابه بغياب الأثر التجاري

خلاصة ما تحقق


- الوصول: 4,356,512 مشاهدة مقابل مستهدف 400,000 — أي 1,089% من المستهدف، ويتجاوز في كل حملة على حدة.
- التفاعل: 37,805 تفاعلاً مقابل مستهدف 16,000 (236%)، بمعدلات تفاعل فعلية تراوحت بين 1.4% و3.6% من الوصول.
- الانضباط المالي: 36,142 ر.س من مخصص 36,000 ر.س للحملات ذات الميزانية المعتمدة — انحراف 0.4% فقط.
- كفاءة التكلفة: متوسط تكلفة الألف مشاهدة للحملات المقيسة بلغ نحو 8.3 هللة.
- نموذج «البنزين المجاني للسيارات الأولى» أثبت فاعليته كأداة افتتاح وتعريف بالمحطات الجديدة في أربع مناطق مختلفة.
- تغطية المناسبات الوطنية: فعالية اليوم الوطني تُقدت في تسع محطات بـ32 لبراً و5,000 استكر و10,000 فواحة، وأكملت تغطية أشهر الربع الثلاثة.

البنود التي لم تتحقق - المبررات والإجراء التصحيحي

حيث لم يرد مبرر موثق في تقرير الحملة أو لوحة المتابعة، يُذكر ذلك صراحةً بدلاً من افتراضه.

البند	المستهدف	المتحقق	المبرر	الإجراء التصحيحي
قياس أثر فعالية اليوم الوطني	لم يُحدّد مستهدف	غير مُقاس	نُفذت الفعالية في تسع محطات بتكلفة 28,807 ر.س — 44% من إجمالي إنفاق الربع — دون تسجيل وصول أو تفاعل أو أي مؤشر أداء.	اعتماد مستهدف وقياس لكل فعالية مناسبات قادمة، وربط المواد الموزعة برمز QR لقياس التفاعل.
اعتماد ميزانية مسبقة لفعالية اليوم الوطني	ميزانية معتمدة	28,807 ر.س فعلي	صُرف المبلغ دون ميزانية مخصصة معتمدة مسجلة، فتعذّرت مقارنة المصروف بالمخطط.	إدراج فعاليات المناسبات ضمن الخطة والميزانية الربعية المعتمدة مسبقاً.
الالتزام بميزانية حملة نجران NJ219	21,000 ر.س	25,000 ر.س	تجاوز 4,000 ر.س باستهلاك 119% — لم يُسجّل مبرر للتجاوز في تقرير الحملة.	توثيق مبرر التجاوز واعتماده، وضبط تقدير ميزانية الحملات الميدانية اليومية.
تسجيل ميزانية حملة ضلbia JA070	ميزانية معتمدة	غير مسجلة	لم تُدخل الميزانية المخصصة ولا الإنفاق الفعلي للحملة في النظام.	استكمال الإدخال لاحتساب عائد الإنفاق، ومراجعة تحمّل الكلفة مع شريك الامتياز.
قياس الأثر التجاري للحملات	لم تُحدّد مستهدفات	غير مُقاس	الفرص التجارية والعملاء المحوّلون وعائد الإنفاق وتكلفة الفرصة ونسبة التحويل غير مُستهدفة وغير مقيسة في الحملات الأربع.	اعتماد مستهدفات تجارية لكل حملة قادمة، وربط القياس ببرنامج الولاء ونقاط البيع.
أربع مهام دورية دون 40 % من مستهدفها	المستهدف المعتمد	33% - 8%	دعم افتتاحات المحطات — امتياز تجاري (8%)، تغطية الافتتاحات — تشغيل (13%)، عرض البنزين — افتتاحات التشغيل (20%)، اجتماعات التشغيل (33%). لم تُسجّل مبررات التأخر في لوحة المتابعة.	تسجيل مبرر لكل مهمة متأخرة، وربط مهام الافتتاحات بجدول الافتتاحات المعتمد.
التصاريح والترتيبات الأمنية — حائل HA052	تصريح + تعاقد أمني	لم يُستوف	لم يُصدر تصريح الفعالية مسبقاً ولم يُتعاقد مع شركة حراسات أمنية قبل التنفيذ.	قائمة تحقق إلزامية لا تُعتمد الحملة قبل استيفائها.
التنسيق المسبق قبل التنفيذ	تنسيق مكتمل	لم يُستوف في 3 حملات	تكررت الملاحظة في نجران NJ219، وحائل HA052 (مع مدير المحطة)، والروضة MK040 (مع الشريك والمؤثرين).	إقفال التنسيق قبل أسبوعين من موعد التنفيذ كشرط لانطلاق الحملة.

الوصول المتحقق لكل حملة وتوزيع الأداء على الأشهر

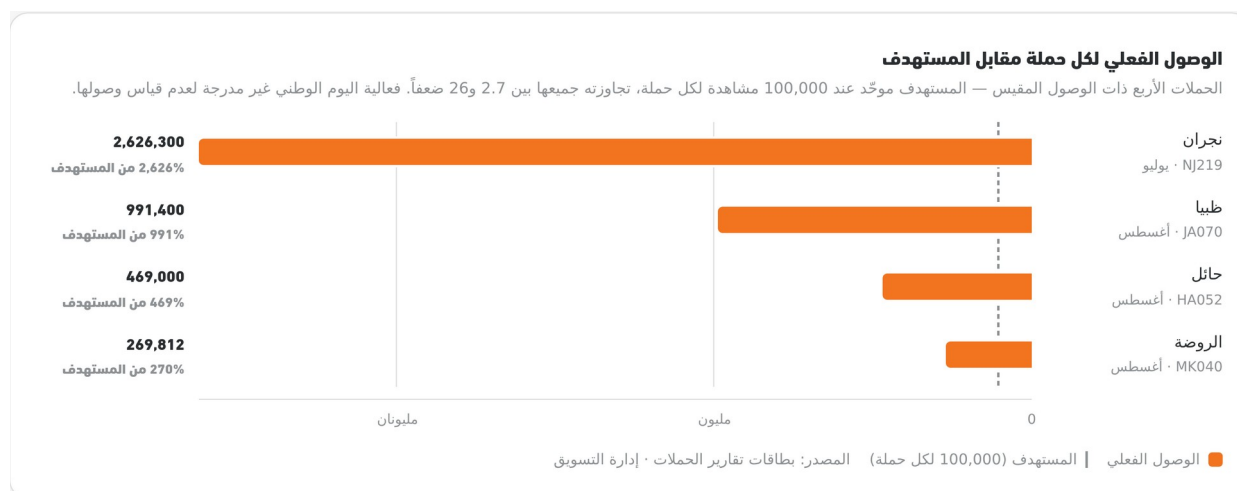

الحملة الأربعة ذات الوصول المقيس. فعالية اليوم الوطني غير مدرجة لعدم قياس وصولها.

توزيع الأداء على أشهر الربع

الشهر	عدد الحملات	الوصول	التفاعلات	الميزانية المخصصة	الإنفاق الفعلي	الحالة
يوليو 2026	1	2,626,300	غير مُقاس	21,000 ر.س	25,000 ر.س	منفذ
أغسطس 2026	3	1,730,212	37,805	15,000 ر.س	11,142 ر.س	منفذ
سبتمبر 2026	1	غير مُقاس	غير مُقاس	غير مسجلة	28,807 ر.س	منفذ
الإجمالي	5	4,356,512	37,805	36,000 ر.س	64,949 ر.س	—

تنبيه على نطاق الأرقام

- أرقام الوصول والتفاعل تمثل أربع حملات من خمس؛ فعالية اليوم الوطني نُقِدت دون قياس وصول أو تفاعل فلا تدخل في تلك المجموع.
- مجموع الإنفاق (64,949 ر.س) يشمل الحملات الخمس، وتمثل فعالية اليوم الوطني 44% منه — أكبر بند إنفاق في الربع وأقله قياساً.

قسم مستقل لكل حملة

لكل حملة قسم يوضح بياناتها التعريفية، ومستهدفاتها وما تحقق منها، وميزانياتها ثم أبرز النتائج والتحديات والفرص والتوصيات الخاصة بها.

01 · البنزين المجاني لأول 300 سيارة — نجران [NJ219]

الشهر	فترة التنفيذ	المحطة المشمولة	الهدف التسويقي	الميزانية
يوليو 2026	4 يوليو 2026 (يوم واحد)	محطة نجران NJ219	وعي بالعلامة التجارية	مخطط 21,000 ر.س · فعلي 25,000 ر.س

القنوات: ميداني · إنستغرام · تيك توك · X · مؤثرين | الجهة المنفذة: مودة أمبون | التصنيف: الحملات التسويقية

المستهدفات وما تحقق منها

المؤشر	المستهدف	المتحقق	نسبة الإنجاز	الحالة
الوصول / المشاهدات (مشاهدة)	100,000	2,626,300	2,626%	تحقق ✓
الالتزام بالميزانية المخصصة (ر.س)	21,000	25,000	119% استهلاك	تجاوز ✗

لم يُرصد مستهدف تفاعل لهذه الحملة ولم يُسجل تفاعل فعلي.

ما لم يتحقق في هذه الحملة · المبرر والإجراء التصحيحي

البند	المستهدف	المتحقق	المبرر	الإجراء التصحيحي
الالتزام بالميزانية المخصصة	21,000 ر.س	25,000 ر.س	تجاوز 4,000 ر.س باستهلاك 119% — لم يُسجل مبرر في تقرير الحملة	توثيق المبرر واعتماده، وضبط تقدير ميزانية الحملات الميدانية اليومية

أبرز النتائج	التحديات
- تجاوز مستهدف الوصول بمقدار 2,526,300 مشاهدة — 2,626 % من المستهدف، وهو أعلى أداء وصول في الربع - رفع الوعي بالعلامة التجارية في سوق نجران - حضور ميداني قوي رافقه انتشار واسع في منصات التواصل الاجتماعي	- ضعف التنسيق المسبق قبل انطلاق الحملة - تجاوز الإنفاق الفعلي للميزانية المخصصة بمقدار 4,000 ر.س (استهلاك 119%) دون مبرر موثق
الفرص الممكن الاستفادة منها	التوصيات
- تكرار النموذج في محطات أخرى بنفس المزيج الإعلاني - تحويل حجم الوصول المرتفع إلى تسجيلات في برنامج الولاء	- اعتماد التنسيق المسبق كبند إلزامي قبل انطلاق أي حملة ميدانية - توثيق مبرر تجاوز الميزانية واعتماده - تفعيل قياس الفرص التجارية والعملاء المحولين لقياس الأثر التجاري لا الوصول فقط

02 · البنزين المجاني لأول 200 سيارة — الامتياز التجاري ظيبا [JA070]

الشهر	فترة التنفيذ	المحطة المشمولة	الهدف التسويقي	الميزانية
أغسطس 2026	8 أغسطس 2026 (يوم واحد)	محطة ظيبا JA070 — امتياز تجاري	وعي بالعلامة التجارية	لم تُسجل

القنوات: ميداني · إنستغرام · تيك توك · X · مؤثرين | الجهة المنفذة: مودة أمبون | التصنيف: الحملات التسويقية

المستهدفات وما تحقق منها

المؤشر	المستهدف	المتحقق	نسبة الإنجاز	الحالة
الوصول / المشاهدات (مشاهدة)	100,000	991,400	991%	✓ تحقق
التفاعلات (تفاعل)	10,000	14,000	140%	✓ تحقق
الالتزام بالميزانية المخصصة	—	—	—	غير مسجلة

معدل التفاعل الفعلي 1.4% من إجمالي الوصول.

ما لم يتحقق في هذه الحملة · المبرر والإجراء التصحيحي

البند	المستهدف	المتحقق	المبرر	الإجراء التصحيحي
تسجيل ميزانية الحملة	ميزانية معتمدة	غير مسجلة	لم تُدخل الميزانية المخصصة ولا الإنفاق الفعلي في تقرير الحملة — كلاهما صفر	استكمال الإدخال ومراجعة ترتيب تحمّل الكلفة مع شريك الامتياز

أبرز النتائج - تجاوز مستهدف الوصول بمقدار 891,400 مشاهدة — 991% من المستهدف - تجاوز مستهدف التفاعلات بنسبة 40% (14,000 مقابل 10,000) - إثبات صلاحية النموذج في محطات الامتياز التجاري لا المحطات المملوكة فقط	التحديات لم تُسجل ميزانية مخصصة ولا إنفاق فعلي للحملة في النظام، فتعذر احتساب كفاءة الإنفاق وعائده
الفرص الممكنة الاستفادة منها - توسيع النموذج على محطات الامتياز التجاري الأخرى - إشراك شريك الامتياز في تحمّل جزء من كلفة الحملة مقابل التغطية	التوصيات - استكمال تسجيل الميزانية المخصصة والفعلية لاحتساب عائد الإنفاق وتكلفة الوصول - تفعيل قياس الفرص التجارية والعملاء المحولين

03 · البنزين المجاني لأول 100 سيارة — افتتاح حائل [HA052]

الشهر	فترة التنفيذ	المحطة المشمولة	الهدف التسويقي	الميزانية
أغسطس 2026	22 أغسطس 2026 (يوم واحد)	محطة حائل HA052	وعي بالعلامة التجارية	مخطط 10,000 رس · فعلي 7,002 رس

القنوات: ميداني · إنستغرام · تيك توك · X · مؤثرين | الجهة المنفذة: مودة أميون | التصنيف: الحملات التسويقية

المستهدفات وما تحقق منها

المؤشر	المستهدف	المتحقق	نسبة الإنجاز	الحالة
الوصول / المشاهدات (مشاهدة)	100,000	469,000	469%	✓ تحقق
التفاعلات (تفاعل)	5,000	16,805	336%	✓ تحقق
الالتزام بالميزانية المخصصة (رس)	10,000	7,002	70% استهلاك	✓ ضمن المخصص

معدل التفاعل الفعلي 3.6% من إجمالي الوصول — الأعلى بين حملات الربع.

ما لم يتحقق في هذه الحملة · المبرر والإجراء التصحيحي

البند	المستهدف	المتحقق	المبرر	الإجراء التصحيحي
التصاريح والترتيبات الأمنية المسبقة	تصريح + تعاقد أمني	لم يُستوف	لم يُصدر التصريح ولم يُتعاقد مع شركة حراسات قبل التنفيذ	قائمة تحقق إلزامية لا تُعتمد الحملة قبل استيفائها

أبرز النتائج	التحديات
- تجاوز مستهدف الوصول بمقدار 369,000 مشاهدة — 469% من المستهدف - تجاوز مستهدف التفاعلات بأكثر من ثلاثة أضعاف (16,805 مقابل 5,000) - توفير 2,998 رس من الميزانية المخصصة (استهلاك 70%)	- عدم إصدار تصريح الفعالية مسبقاً - عدم التعاقد المسبق مع شركة حراسات أمنية - ضعف التنسيق المسبق مع مدير المحطة
الفرص الممكنة الاستفادة منها	التوصيات
- اعتماد الحملة كنموذج قياسي لافتتاحات المحطات الجديدة - توجيه الوفر في الميزانية لتوسيع التغطية بالمؤثرين	- التنسيق والتنظيم المسبق مع مدير المحطة - إدراج تصريح الفعالية والتعاقد الأمني ضمن قائمة تحقق إلزامية قبل الافتتاح - تفعيل قياس الفرص التجارية والعملاء المحولين

04 . افتتاح محطة درب — الروضة [MK040]

الشهر	فترة التنفيذ	المحطة المشمولة	الهدف التسويقي	الميزانية
أغسطس 2026	26 - 29 أغسطس 2026 (3 أيام)	محطة الروضة MK040	وعي بالعلامة التجارية	مخطط 5,000 رس · فعلي 4,140 رس

القنوات: ميداني · إنستقرام · تيك توك · X · مؤثرين | الجهة المنفذة: مودة أميون | التصنيف: الحملات التسويقية

المستهدفات وما تحقق منها

المؤشر	المستهدف	المتحقق	نسبة الإنجاز	الحالة
الوصول / المشاهدات (مشاهدة)	100,000	269,812	270%	✓ تحقق
التفاعلات (تفاعل)	1,000	7,000	700%	✓ تحقق
الالتزام بالميزانية المخصصة (رس)	5,000	4,140	83% استهلاك	✓ ضمن المخصص

معدل التفاعل الفعلي 2.6% من إجمالي الوصول. الحملة الوحيدة الممتدة على ثلاثة أيام.

أبرز النتائج	التحديات
- تجاوز مستهدف الوصول بمقدار 169,812 مشاهدة — 270% من المستهدف - تجاوز مستهدف التفاعلات بسبعة أضعاف (7,000 مقابل 1,000) - توفير 860 رس من الميزانية المخصصة (استهلاك 83%)	- ضعف التنسيق المسبق مع الشريك - ضعف التنسيق المسبق مع المؤثرين
الفرص الممكنة الاستفادة منها	التوصيات
- تمديد مدة حملات الافتتاح إلى 3 أيام أثبت فاعليته — تعميمه على الافتتاحات القادمة - بناء قائمة مؤثرين معتمدة مسبقاً لكل منطقة لتسريع التعاقد	- إقفال التنسيق مع الشريك والمؤثرين قبل أسبوعين من موعد الافتتاح - تفعيل قياس الفرص التجارية والعملاء المحولين

05 . فعالية اليوم الوطني في المحطات [9 محطات]

الشهر	فترة التنفيذ	المحطة المشمولة	الهدف التسويقي	الميزانية
سبتمبر 2026	سبتمبر 2026 — موسم اليوم الوطني	9 محطات محدّدة	وعي بالعلامة التجارية * المشاركة في المناسبات الوطنية	28,807 رس. * دون ميزانية مخصصة مسجلة

القنوات: تزيين ميداني بالليزرات * استكرات ترويجية * فواحات | الجهة المنفذة: إدارة التسويق | التصنيف: فعاليات المناسبات

المخرجات المنفذة والتكلفة

البند	الكمية	التكلفة	تكلفة الوحدة	حصتها من تكلفة الفعالية
الليزرات	32	19,320 رس.	603.75 رس.	67%
الاستكرات الموزعة	5,000	2,587 رس.	0.52 رس.	9%
الفواحات الموزعة	10,000	6,900 رس.	0.69 رس.	24%
الإجمالي	—	28,807 رس.	3,201 رس. / محطة	100%

المستهدفات وما تحقق منها

المؤشر	المستهدف	المتحقق	نسبة الإنجاز	الحالة
التغطية الميدانية (محطات)	9	9	100%	✓ تحقق
الوصول / المشاهدات	لم يُحدّد	غير مُقاس	—	غير مُقاس
التفاعلات	لم يُحدّد	غير مُقاس	—	غير مُقاس
الالتزام بالميزانية المخصصة	غير مسجلة	28,807 رس.	—	غير مُقارَن

تمثل هذه الفعالية 44% من إجمالي إنفاق الربع الثالث (64,949 رس.)، وهي أكبر بند إنفاق منفرد فيه.

ما لم يتحقق في هذه الحملة - المبرر والإجراء التصحيحي

البند	المستهدف	المتحقق	المبرر	الإجراء التصحيحي
قياس أثر الفعالية	مؤشرات معتمدة	غير مُقاس	لم تُحدّد مؤشرات أداء قبل التنفيذ، ولم يُسجّل وصول أو تفاعل أو أثر تجاري رغم أنها أكبر بند إنفاق في الربع	اعتماد مؤشرات ومستهدفات لكل فعالية قبل الصرف، وربط المواد الموزعة برمز QR
اعتماد ميزانية مسبقة	ميزانية معتمدة	غير مسجلة	صُرفت 28,807 رس. دون ميزانية مخصصة معتمدة مسجلة في النظام	إدراج فعاليات المناسبات ضمن الخطة والميزانية الربعية المعتمدة مسبقاً

أبرز النتائج	التحديات
- تغطية تسع محطات في مناسبة وطنية واحدة — أوسع انتشار ميداني في الربع - تنفيذ 32 ليزراً وتوزيع 5,000 استكر و 10,000 فواحة - إكمال تغطية أشهر الربع الثلاثة بنشاط تسويقي	- غياب مؤشرات أداء معتمدة للفعالية قبل تنفيذها - عدم قياس الوصول أو التفاعل أو الأثر التجاري - الصراف دون ميزانية مخصصة معتمدة مسجلة - تركز 67% من التكلفة في بند واحد (الليزرات) دون مقارنة عروض موثقة
الفرص الممكنة الاستفادة منها	التوصيات
- الاستكرات والفواحات قناة قياس جاهزة — رمز QR يحوّل 15,000 قطعة إلى نقاط قياس وتسجيل في برنامج الولاء - اعتماد حزمة مناسبات قياسية متكررة (اليوم الوطني • يوم التأسيس) بتكلفة وحدة معلومة مسبقاً - التفاوض على سعر الليزر عبر عقد موسمي بدل الشراء لكل فعالية	- عدم اعتماد أي فعالية مناسبات مستقبلاً دون مؤشرات ومستهدفات وميزانية معتمدة مسبقاً - إضافة رمز QR على المواد الموزعة في الفعالية القادمة لقياس الأثر - توثيق ثلاثة عروض أسعار على الأقل لبند الليزرات قبل الاعتماد

المهام الدورية والشهرية - المستهدف مقابل الإنجاز

إلى جانب أداء الحملات، يلتزم فريق التسويق بتسعى مهام دورية معتمدة. الأرقام أدناه هي الإنجاز المسجل في لوحة متابعة المهام حتى تاريخ إعداد هذا التقرير مقابل المستهدف المعتمد لكل مهمة، مرتبة تنازلياً بحسب نسبة الإنجاز.

61	4	44%	9
إجمالي الوحدات المنجزة	مهام دون 40%	متوسط نسبة الإنجاز	مهام دورية معتمدة
من إجمالي 287 وحدة مستهدفة	تحتاج خطة استدرار في الربع الرابع	متوسط نسب الإنجاز عبر المهام التسع	مهمة واحدة مكتملة - 8 قيد التنفيذ

المهمة	المستهدف	الإنجاز	نسبة الإنجاز	الحالة
ملف المؤثرين مصنفين بالمدن	5	5	100%	مكتمل ✓
المشاركة في الأيام العالمية والمناسبات	12	10	83%	متقدم ✓
عقود مؤثرين	6	3	50%	قيد التنفيذ ⚠
اجتماعات الامتياز التجاري	12	6	50%	قيد التنفيذ ⚠
عرض البنزين — افتتاحات الامتياز التجاري	20	8	40%	قيد التنفيذ ⚠
اجتماعات التشغيل	12	4	33%	متأخر ✗
عرض البنزين — افتتاحات التشغيل	20	4	20%	متأخر ✗
تغطية افتتاحات المحطات الجديدة — تشغيل	100	13	13%	متأخر ✗
دعم افتتاحات المحطات الجديدة — امتياز تجاري	100	8	8%	متأخر ✗

قراءة سريعة

- مهمة واحدة مكتملة: «ملف المؤثرين مصنفين بالمدن» بنسبة 100% — وهي المهمة الأساسية الوحيدة ضمن القائمة.
- الأقرب للاكتمال: «المشاركة في الأيام العالمية والمناسبات» عند 83% (10 من 12).
- أربع مهام دون 40%، وثلاث منها مرتبطة بافتتاحات المحطات: تغطية الافتتاحات — تشغيل (13%)، ودعم الافتتاحات — امتياز تجاري (8%)، وعرض البنزين — افتتاحات التشغيل (20%). وهي مهام يرتبط إنجازها بوتيرة الافتتاحات الفعلية لا بجهد الفريق وحده.
- اجتماعات التشغيل عند 33% مقابل اجتماعات الامتياز التجاري عند 50% — فجوة تستدعي تثبيت وتيرة اجتماعات التشغيل.
- لم تُسجل مبررات التأخر في لوحة المهام، ويوصى بإضافتها لكل مهمة دون 40% قبل إقفال الربع.

التحديات التي واجهت تنفيذ حملات الربع

المجال	التحدي	الحملات المتأثرة	الأثر
تشغيلي	ضعف التنسيق المسبق قبل انطلاق الحملة — مع مدير المحطة والشريك والمؤثرين	NJ219 · HA052 · MK040	تكرر في 3 حملات من 4؛ يرفع مخاطر التنفيذ ويقلص زمن التجهيز
تنظيمي	عدم إصدار تصريح الفعالية والتعاقد مع شركة حراسات أمنية قبل التنفيذ	HA052	مخاطرة نظامية وأمنية مباشرة على فعالية جماهيرية
مالي	تجاوز الميزانية المخصصة دون مبرر موثق	NJ219	تجاوز 4,000 رس. (119% استهلاك)
مالي	عدم تسجيل الميزانية المخصصة والفعالية للحملة	JA070	يتعذر احتساب كفاءة الإنفاق وعائده للحملة
قياس	المؤشرات التجارية غير مُستهدفة وغير مقيسة	الحملات الخمس	التقييم مقتصر على الوصول والتفاعل دون أثر على المبيعات
قياس	تسجيل عدد التفاعلات في النظام تحت مسمى «معدل التفاعل %»	JA070 · HA052 · MK040	يُنتج قيمةً مضللة مثل «16,805%» ما لم تُصحح وحدة القياس
تخطيطي	مستهدف الوصول الموحد (100,000 لكل حملة) أقل بكثير من الأداء الفعلي	الحملات الأربع	تجاوز بين 2.7 و26 ضعفاً يُفقد المستهدف قيمته كأداة قياس
قياس	تنفيذ فعالية اليوم الوطني دون مؤشرات أداء معتمدة ولا قياس وصول أو تفاعل	فعالية اليوم الوطني	أكبر بند إنفاق في الربع (28,807 رس. · 44%) وأقله قياساً
مالي	الصرف دون ميزانية مخصصة معتمدة مسبقاً	فعالية اليوم الوطني · JA070	يتعذر قياس الانضباط المالي على 45% من إنفاق الربع
شراء	تركز 67% من تكلفة الفعالية في بند الليزرات دون مقارنة عروض موثقة	فعالية اليوم الوطني	19,320 رس. بمعدل 603.75 رس. للوحدة دون مرجع سعري

الفرص الممكنة الاستفادة منها

فرص مستخلصة من أداء الربع نفسه، قابلة للتفعيل خلال الربع الرابع.

توسيع نموذج أثبت نجاحه

- تعميم «البنزين المجاني للسيارات الأولى» كنموذج قياسي لكل افتتاح محطة جديدة — كلفة منخفضة ووصول يفوق المستهدف بأضعاف.
- تمديد مدة حملة الافتتاح إلى ثلاثة أيام كما في الروضة MK040 بدل يوم واحد.
- نقل النموذج إلى محطات الامتياز التجاري بعد نجاحه في طبيا JA070.
- اعتماد حزمة مناسبات قياسية متكررة (اليوم الوطني - يوم التأسيس) بتكلفة وحدة معلومة مسبقاً.

تحويل الوصول إلى قيمة تجارية

- ربط الحملات ببرنامج الولاء وتحويل الوصول المرتفع إلى تسجيلات وعملاء متكررين.
- تفعيل قياس الفرص التجارية والعملاء المحولين لاحتساب عائد الإنفاق لأول مرة.
- إشراك شريك الامتياز في تحمل جزء من كلفة الحملة مقابل التغطية.
- تحويل 15,000 قطعة موزعة (استكرات وفواحات) إلى نقاط قياس عبر رمز QR يربطها ببرنامج الولاء.

رفع جاهزية التنفيذ

- إعداد دليل تشغيلي موحد للافتتاحات يغطي التصاريح والحراسات والتنسيق مع مدير المحطة والشريك.
- بناء قائمة مؤثرين معتمدة لكل منطقة لتقصير زمن التعاقد ورفع جودة التغطية.
- إعادة معايرة مستهدف الوصول على أساس الأداء الفعلي بدل رقم ثابت لا يعكس حجم المحطة أو المنطقة.
- التفاوض على سعر الليزر (603.75 ر.س للوحدة) عبر عقد موسمي بدل الشراء المنفصل لكل فعالية.

التوصيات والخطوات التالية للربع الرابع

مرتبة بحسب الأولوية — الأثر على جودة القرار أولاً ثم جاهزية التنفيذ ثم التوسع.

#	التوصية	التفصيل	التوقيت
1	اعتماد مستهدفات تجارية لكل حملة	تحديد مستهدف للفرض التجارية والعملاء المحولين وعائد الإنفاق قبل اعتماد أي حملة، وربط القياس ببرنامج الولاء ونقاط البيع. بدون ذلك يبقى تقييم الحملات مقتصرأ على الوصول.	أولوية عالية · قبل انطلاق حملات الربع الرابع
2	عدم اعتماد أي فعالية مناسبات دون مؤشرات وميزانية مسبقة	فعالية اليوم الوطني استهلكت 44% من إنفاق الربع دون مستهدف معتمد ولا قياس. يلزم اعتماد مؤشرات ومستهدفات وميزانية لكل فعالية قبل الصرف، وإضافة رمز QR على المواد الموزعة لقياس الأثر.	أولوية عالية · قبل فعالية يوم التأسيس
3	تصحيح وحدة قياس التفاعل في النظام	تسجيل عدد التفاعلات كعدد ومعدل التفاعل كنسبة في حقلين منفصلين، لتفادي قيم مضللة مثل «16,805%» في التقارير المرفوعة للإدارة.	أولوية عالية · إجراء فوري
4	قائمة تحقق إلزامية قبل اعتماد أي حملة ميدانية	تشمل تصريح الفعالية، التعاقد الأمني، التنسيق المكتمل مع مدير المحطة والشريك والمؤثرين، واعتماد الميزانية — ولا تنطلق الحملة قبل استيفائها.	أولوية عالية · قبل أول افتتاح قادم
5	استكمال البيانات الناقصة للربع الثالث	إدخال ميزانية حملة طليبا JA070، وتوثيق مرر تجاوز ميزانية نجران NJ219، وتسجيل ميزانية معتمدة لفعالية اليوم الوطني — ثم إعادة اعتماد هذا التقرير بنسخته النهائية.	أولوية عالية · قبل الاعتماد النهائي
6	خطة استدراك للمهام الدورية المتأخرة	أربع مهام دون 40% من مستهدفها، ثلاث منها مرتبطة بوتيرة افتتاحات المحطات. يلزم ربطها بجدول الافتتاحات المعتمد للربع الرابع، وتسجيل مرر لكل مهمة متأخرة.	أولوية عالية · قبل إقبال الربع الثالث
7	إعادة معايرة مستهدف الوصول	استبدال المستهدف الموحد (100,000) بمستهدف يُبنى على حجم المحطة وكثافة المنطقة وقنوات التنفيذ، مستفيدين من الأداء الفعلي في الربع الثالث كخط أساس.	أولوية متوسطة · ضمن خطة الربع الرابع
8	تحديث حالات الحملات في النظام	حملتا حائل HA052 والروضة MK040 ما زالتا بحالة «مخطط لها» رغم تنفيذهما وتسجيل نتائج وإنفاق فعلي لهما.	أولوية متوسطة · إجراء فوري
9	توسيع النموذج على الافتتاحات القادمة	اعتماد «البزوين المجاني» كحزمة افتتاح قياسية بثلاثة أيام، مع قائمة مؤثرين معتمدة مسبقاً لكل منطقة.	أولوية متوسطة · خطة الربع الرابع

المنهجية ومصادر البيانات وملاحظات الجودة

البند	التفصيل
مصدر البيانات	بطاقات تقارير الحملات الصادرة من نظام إدارة الحملات التسويقية — محطات درب، ولوحة «المهام الدورية والشهرية لفريق العمل».
فترة التغطية	1 يوليو - 30 سبتمبر 2026 م (الربع الثالث).
نسبة الإنجاز	تُحتسب = المتحقق ÷ المستهدف. «تحقق» عند 100% فأكثر، و«تحقق جزئياً» بين 80% و99%، وما دون ذلك «لم يتحقق».
تكلفة الألف مشاهدة	تُحتسب للحملات المقيسة فقط: $36,142 \div 4,356,512 \times 1000 \approx 8.3$ هللة. فعالية اليوم الوطني خارج الحساب لعدم قياس وصولها.
نطاق المجاميع	مجاميع الوصول والتفاعل تخص أربع حملات من خمس. مجموع الإنفاق (64,949 رس) يشمل الحملات الخمس.
المحطات المشمولة	أربع محطات في حملات الافتتاح، وتسع محطات في فعالية اليوم الوطني؛ لم يُحدّد ما إذا كانت التسع تتضمن أيّاً من الأربع، لذا لم يُجمع العدد في رقم واحد.
وحدة التفاعل	تعرض بطاقات النظام حقل «معدل التفاعل %» بقيم تمثل عدد التفاعلات لا نسبة مئوية (مثال: 14,000 تفاعل على وصول 991,400 = معدل 1.4%). عولجت في هذا التقرير كعدد تفاعلات، وأدرج المعدل الفعلي المحسوب ضمن نتائج كل حملة.
حالات الحملات	حملتا HA052 و MK040 مسجلتان في النظام بحالة «مخطط لها» رغم مرور تاريخ تنفيذهما وتسجيل نتائج وإنفاق فعلي؛ عُوملتا في هذا التقرير كحملتين منتهيتين.
مستهدفات فريق العمل	الفترة الزمنية التي يغطيها كل مستهدف (سنوية أم ربعية) لم تُحدّد في لوحة المتابعة، لذا عُرضت النسب كما هي دون مقارنتها بنسبة الزمن المنقضي.
البيانات الناقصة	ميزانية JA070 غير مسجلة · مبرر تجاوز ميزانية NJ219 غير موثّق · فعالية اليوم الوطني بلا ميزانية معتمدة ولا مؤشرات قياس ولا تواريخ تنفيذ محددة · المؤشرات التجارية غير مقيسة في الحملات الخمس.
حدود التقرير	لا يتضمن التقرير قياساً لأثر الحملات على المبيعات أو حركة العملاء داخل المحطات لعدم توفر بياناته، ولا قياساً لأثر فعالية اليوم الوطني لعدم رصد مؤشرات لها.
